
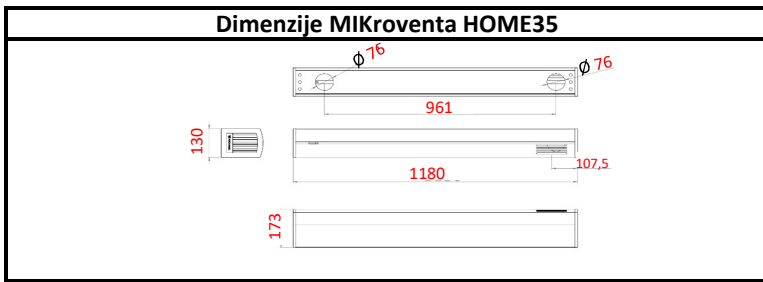
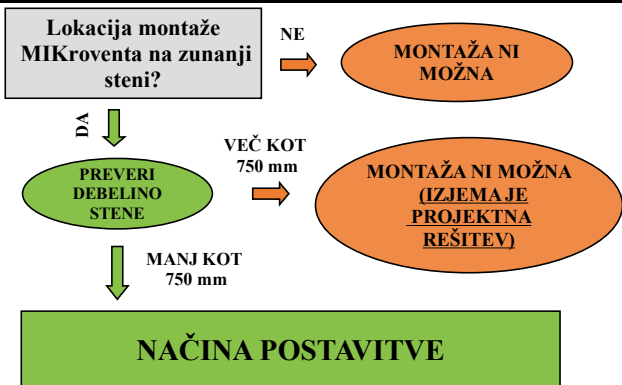
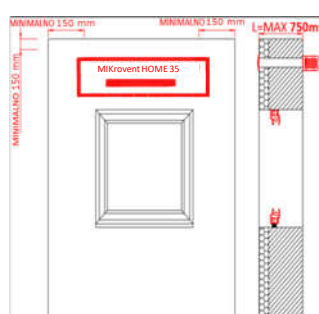



Ocena sposobnosti montaže MIKroventa HOME 35

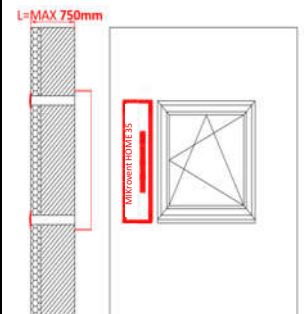

DRUGI NAČINI POSTAVITVE
(pomoč komercialista-merilca)

Obkroži črko pred izbrano postavitvijo:

<p>a)</p> <p>HORIZONTALNO SAMOSTOJNO NA STENI</p>	<p>b)</p> <p>VERTIKALNO SAMOSTOJNO NA STENI</p>
Debelina stene: _____ mm 	Debelina stene: _____ mm 
Material/vrsta stene: _____ MIKrovent ne sme biti montiran direktno nad oknom , ker bi s tem podrli statične zakone gradbeništva!(preklada)!	Material/vrsta stene: _____ MIKrovent ne sme biti montiran tako , da bi z montažo podrli statične zakone gradbeništva!

- Označi z ✓ oz. ✗
- Oddaljenost od stene (levo in desno), stropa **minimalno 150mm**
 - Je možen dostop za namestitev zunanje rešetke
 - Vpih **direktno** v prostor
 - Priključek na **električno omrežje**
 - Dve izvrtini **Ø100** za prebojno cev
- www.ekosklad.si
- 

Opombe:

- Pri preboju skozi steno moramo biti pozorni, da skozi steno niso razpeljane inštalacije (električne, vodovodne ipd.)
- MIKrovent mora biti priključen direktno na omrežje (uporaba električnih podaljškov ni dovoljena!)
- V primeru podometne priključitve (brez vtikača) je za izvedbo odgovorna stranka sama!

SKICA

